

Łódź, dnia 28.08.2020 r.

ZIM-DZ.2620.32.2020

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Budowa drogi 2KDY na terenie Nowego Centrum Łodzi**” Nr sprawy **ZIM-DZ.2620.32.2020**

- I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp – do Zamawiającego zostały wniesione pytania¹ Wykonawców, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

ZESTAW 1

Pytanie 1:

Prosimy o uzupełnienie dokumentów formalnych o Decyzję Pozwolenia na budowę i Zgłoszenia. Powyższe dokumenty nie zostały dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż niezbędne dokumenty zezwalające na rozpoczęcie robót zostaną przekazane po podpisaniu umowy i zatwierdzeniu projektu TOR. Zamawiający jest aktualnie w trakcie uzyskiwania w/w dokumentów.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie że Dokumentacja Projektowa jest kompletna dla realizacji zadania budowy drogi 2KDY.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ze względu na postępujące zmiany dotyczące sąsiedniej inwestycji, tj. 7KDY, Zamawiający przekaże autorowi opracowania dokumentacji projektowej ostateczne wytyczne do zaktualizowania projektu okablowania dla monitoringu. Zmiany dotyczyć mogą wyboru rozwiązania umiejscowienia skrzynek dla monitoringu.

Pytanie 3:

Prosimy o przekazanie odwiertów geologicznych na obszarze prowadzenia prac – prosimy o wskazaniem układu warstw podłoża gruntowego dla terenu prowadzonych prac - nie zostały dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż opracowanie geologiczne zawierające układ warstw podłoża gruntowego znajduje się w dokumentacji projektowej „CZĘŚĆ I – ZESZYT 2 – V OPRACOWANIE GEOLOGICZNE”.

Pytanie 4:

Z uwagi na połączenie oświetlenia 2KDY z oświetleniem inne inwestycji, tj. 7KDY prosimy o przedstawienie pełnego schematu sieci, niezbędnych obliczeń i doboru zabezpieczeń – nie zostały dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż miejscem zasilania instalacji oświetlenia jest słup oświetlenia podstawowego na terenie drogi 7KDY. Szczegóły dot. zasilania zostały przedstawione na rysunku pt. „schemat jednokreskowy”. Oświetlenie zostało zaprojektowane kablem YAKY 5x16, podział opraw na 3 fazy. Obliczenia zostały zawarte w dokumentacji projektowej.


Pytanie 5:

Prosimy o przekazanie detalu połączenia z 3KDY i 7KDY- nie zostały dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wszelkie uszczegółowienia zostaną przekazane po podpisaniu umowy.

Wycinek rysunku z uszczegółowieniem styku nawierzchni:

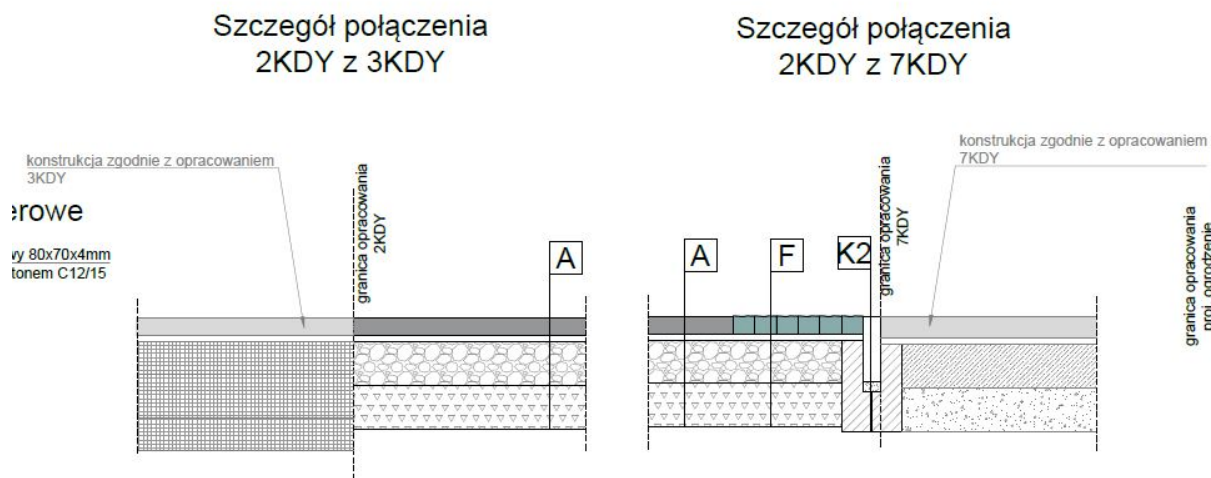

Pytanie 6:

Prosimy o przekazanie dokumentów wskazanych w opracowaniu „wg odrębnego opracowania” np. na rys BZB54-PW-KDS-RYS-00001-3.pdf.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż opracowanie jest kompletne. Po podpisaniu umowy zostanie przekazane opracowanie bez powyższego zapisu.

Pytanie 7:

Prosimy o jednoznaczne określenie materiału wykończeniowego na pochylni środkowej ? (opis techniczny określa wykonanie płytami granitowymi 40x60, a rysunki 25x25).





Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rysunki określają nawierzchnię na pochylni środkowej (pochylnia nr 3 – rys. BZB54-PW-PZT-RYS00108-3) jako typ nawierzchni nr 2 – płyty granitowe 40x60.

Pytanie 8:

Prosimy o jednoznaczne określenie materiału wykończeniowego na pochylni południowej (opis techniczny w PB określa wykonanie klinkierem, natomiast rysunek pokazuje wykonanie z płyt granitowych).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pochylnia nr 1 (południowa) zgodnie z rysunkami PZT wykończona jest nawierzchnią nr 3 – płyty granitowe 25x25. Pochylnia nr 2 (północna) jest wykończona w klinkierze.

Pytanie 9:

Odwodnienie zostało narysowane jako niebieska gruba kreska (tak samo jak szyna stalowa zatopiona) oraz czerwone kreskowane linie. Prosimy o wyjaśnienie położenia i ujednoczenie oznakowania na dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż szyny wrysowane są innym kolorem niż odwodnienie. Na rysunkach z branży instalacyjnej szyny są zatem wyszarzone.

Pytanie 10:

Prosimy o wskazanie jakości materiałów na detalach rysunków tak aby Wykonawca wiedział jakich parametrów oczekuje Zamawiający, z uwagi na to, że nie zostały one określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż jakość materiałów określona została w opracowaniu STWIORB.

Pytanie 11:

Prosimy o jednoznaczne wskazanie miąższości warstwy podsypki pod kostką klinkierową (opis zawiera warstwę 4 cm rysunki zaś 5 cm).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż miąższość warstwy podsypki pod kostką klinkierową wynosi 4 cm.

Pytanie 12:

Prosimy o jednoznaczne określenie wymiarów kostki klinkierowej, w większości dokumentacji miąższość warstwy kostki to 7 cm, a w przekroju pochylni ma ona 6cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wysokość kostki klinkierowej wynosi 7 cm.

Pytanie 13:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o poprawny schemat położenia warstw wykończeniowych oraz wrysowanie kopertowań oraz rzędnych na połączeniu z istniejącymi nawierzchniami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wszelkie uszczegółowienia zostaną przekazane po podpisaniu umowy.





Pytanie 14:

Z uwagi na budowę systemu CCTV w ciągu 2KDY zawierającego kolejne pk. kamerowe prosimy o informację, o jakie elementy należy rozbudować system miejski.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy zapewnić 2 szt. Przestrzeni dyskowej RAID 6 o pojemności rzędu 6000 GB

Pytanie 15:

Prosimy o określenie sposobu „zamknięcia” nawierzchni w miejscach projektowanych budynków na działce sąsiedniej nr 180/68.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż sposób „zamknięcia” nawierzchni w miejscach projektowanych budynków został pokazany w opracowaniu drogowym dokumentacji.

Pytanie 16:

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający zapewni ze strony Projektanta nadzór autorski (zgodnie z Ustawą PB) w trakcie realizacji prac.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapewni ze strony Projektanta nadzór autorski w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

Pytanie 17:

Prosimy o modyfikację postanowień §8 ust 17 poprzez wykreślenie obowiązku ujęcia w wynagrodzeniu kosztu prac projektowych z uwagi na fakt, że Przedmiot Zamówienia nie obejmuje wykonania prac projektowych przez Wykonawcę i z tego względu postanowienie te są sprzeczne z zakresem Przedmiotu Zamówienia. Ewentualnie wnosimy o jednoznaczne określenie przez Zamawiającego jakie prace projektowe miałyby wykonywać Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia i przesłanie szczegółowe zakresu tych prac umożliwiającego wykonanie wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. Równocześnie Zamawiający informuje, iż wszystkie obowiązki Wykonawcy zostały wyszczególnione w SIWZ.

Pytanie 18:

Wnosimy o usunięcie postanowień §1 ust 3 lit. q, z uwagi na fakt, że Wykonawca nie ma możliwości wykonania wyceny tego zakresu prac, ponieważ dokumentacja projektowa została wykonana na zlecenie Zamawiającego i wprowadzanie ewentualnych zmian odbywać się będzie na podstawie uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a autorem dokumentacji projektowej, na które Wykonawca nie ma wpływu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 19:

Prosimy o potwierdzenie, że profil ułożenia linii 110kV jest zgodny z zamieszczonym w dokumentacji przetargowej.





Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że profil ułożenia linii 110kV, który został zamieszczony w dokumentacji przetargowej może różnić się w stosunku do stanu istniejącego w związku z prowadzonymi pracami na styku budowy drogi 2KDY z drogą 7KDY (usunięcie kolizji linii kablowej z projektowaną drogą podziemną).

Pytanie 20:

Prosimy o potwierdzenie, że profil kanalizacji teletechnicznej i zastosowane rozwiązania są zgodne z wymaganiami Zamawiającego i ZDiT.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zastosowane rozwiązania są zgodne z wymaganiami Zamawiającego i ZDiT.

Pytanie 21:

Z uwagi na sąsiedztwo RPZ Śródmieście prosimy o informację, czy uzgodniono z Gestorem Sieci (podczas prowadzenia prac) możliwość dojazdu służb PGE do swoich urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie prowadził żadnych uzgodnień z Gestorem Sieci.

Pytanie 22:

Prosimy po potwierdzenie, że projektowane nasadzenia mają być zgodne z przedstawionymi dokumentami i zbliżeniami z infrastrukturą podziemną.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż projektowane nasadzenia uzgodnione zostały z Biurem Architekta Miasta. W opisie technicznym w projekcie zieleni znajduje się informacja na temat rozwiązań w przypadku z potencjalnymi kolizjami z infrastrukturą podziemną.

Pytanie 23:

Prosimy o informację, czy dokumentacja przetargowa uwzględnia w swoim zakresie możliwość ułożenia zasilania sąsiedniej inwestycji, tj. drogi podziemnej w ciągu 7KDY.

Odpowiedź:

Dokumentacja przetargowa nie uwzględnia w swoim zakresie ułożenia zasilania sąsiedniej inwestycji, tj. drogi podziemnej w ciągu 7KDY.

Pytanie 24:

W dokumentacji branży sanitarnej widnieją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla potrzeb dz. 180/68. Prosimy o informację, kiedy przewidywana jest realizacja tego zakresu? Powyższe jest niezbędne do prawidłowego wykonania prac w ramach Przedmiotu Zamówienia dot. instalacji sanitarnych na terenie 2KDY.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada informacji, kiedy przewidywana jest realizacja robót na działce 180/68.

Pytanie 25:

Prosimy o informację, czy sieci sanitarne będą wykonywane zgodnie z Decyzją Pozwolenia na budowę lub Zgłoszenia. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie wskazanych dokumentów, gdyż nie zostały one dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.





Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1.

Pytanie 26:

Prosimy o informację, czy sieci wod-kan w ciągu ul. 3KDY zostały przejęte przez ZWiK.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada wiedzy na temat drogi 3KDY.

Pytanie 27:

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada wytyczne PGE i PKP Energetyka dot. pracy w zbliżeniu linii 110kV i w przypadku gdy takie wytyczne Zamawiający uzyskał prosimy o ich przekazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż warunki prac w zbliżeniu znajdują się w części dokumentacji z załącznikami formalnymi.

Pytanie 28:

Z uwagi na silnie zurbanizowany teren wokół przewidywanego placu budowy, inne toczące się inwestycje, prosimy o wskazanie możliwych punktów poboru mediów na potrzeby zaplecza budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż powyższe pozostaje w gestii Wykonawcy.

Pytanie 29:

Prosimy o wskazanie terenu przewidzianego na potrzeby zaplecza budowy, placów składowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż powyższe pozostaje w gestii Wykonawcy.

Pytanie 30:

Prosimy o precyzyjne podanie jaki zakres prac przedmiotu zamówienia stanowi przebudowa drogi 2KDY.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres prac przedstawiony został w dokumentacji projektowej.

Pytanie 31:

Prosimy o wskazanie czy Wykonawca winien w swojej ofercie zawrzeć koszty ewentualnych wyłączeń i nadzorów ze strony PGE i PKP Energetyka.

Odpowiedź:

Wykonawca winien w swojej ofercie zawrzeć koszty ewentualnych wyłączeń i nadzorów ze strony PGE i PKP Energetyka.

Pytanie 32:

Z uwagi na połączenie urządzeń monitoringu CCTV 2KDY z sąsiednią inwestycją 7KDY prosimy o informację, czy w ofercie należy ująć koszty związane z wejściem na tą budowę i na jakich dokładanie zasadach się to odbędzie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż po stronie Wykonawcy jest koordynacja z sąsiednimi inwestycjami i ewentualne roboty oraz koszty z tym związane.





Pytanie 33:

Prosimy o potwierdzenie, iż w ofercie należy ująć koszty związane w szczególności z postanowieniami § 1, pk. 3 ustęp d) umowy, tj. wykonaniem inwentaryzacji budynków i dróg sąsiadujących z placem budowy przed rozpoczęciem robót.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w ofercie należy ująć wszystkie w/w koszty.

Pytanie 34:

Prosimy o określenie długości gwarancji na zabudowywane materiały/urządzenia elektryczne i teletechniczne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż gwarancja na zabudowywane materiały/urządzenia elektryczne wynosi 5 lat, natomiast na słupy 10 lat.

Pytanie 35:

Prosimy o informację, kto będzie ponosił koszty wejścia w tereny osób trzecich niezbędnych do realizacji inwestycji i czy Zamawiający jest w posiadaniu takich zgód.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ewentualna konieczność wejścia w teren przyległy do inwestycji w celu prawidłowej realizacji zadania, oraz związane z tym koszty, pozostaje po stronie Wykonawcy.

Pytanie 36:

W związku z postanowieniami § 1 ust. 3 lit. hh, prosimy o szczegółowe wskazanie, jakie podmioty planują wykonywanie prac na terenie budowy oraz w jakich terminach. Obecne brzmienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest niejasne w tym zakresie i nie pozwala na przewidzenie sposobu realizacji Przedmiotu Zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada takiej wiedzy.

Pytanie 37:

Prosimy o informacje czy realizowane prace objęte Przedmiotem Zamówienia będą ingerowały w zakresy wykonane przez inne podmioty i objęte gwarancją tych wykonawców. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, prosimy o informacje czy w przypadku ingerencji w zakresy wykonane przez innych wykonawców zasady gwarancji tych wykonawców została z nimi uzgodnione i jeżeli tak prosimy o przestanie uzgodnienia lub wyjaśnienie na jakich zasadach te ingerencje będą się odbywały.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ewentualna konieczność ingerencji w zakresy wykonanych sąsiednich inwestycji, tj. wszelkie uzgodnienia związane z gwarancją i technologią prowadzonych prac, leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie 38:

Z uwagi na prowadzone prace w ciągu 7KDY prosimy o podanie planowanego zakończenia prac budowy 7KDY.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż planowany termin zakończenia budowy drogi 7KDY to 30.08.2021.





Pytanie 39:

Prosimy o informację czy Zamawiający planuje realizować w trakcie trwania umowy na jej terenie inne prace bądź udostępnić teren osobą trzecim. Prosimy o podanie zakresu i terminu planowanych realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie ma wiedzy na temat planowanych inwestycji na sąsiednich działkach.

Pytanie 40:

Prosimy o wykreślenie z postanowień § 1 ust. 3 lit. jj umowy obowiązku weryfikowania z gestorami sieci przebiegu sieci przez teren budowy. Taka weryfikacja dokonywana jest na etapie sporządzania dokumentacji projektowej i za jej prawidłowość odpowiada projektant. Prosimy zatem o potwierdzenie, że taka weryfikacja została przeprowadzona. Ponadto w związku z nałożeniem na Wykonawcę, w tym samym postanowieniu, obowiązku realizacji wszystkich obowiązków wynikających z uzgodnień i warunków gestorów sieci, prosimy o potwierdzenie, że wszystkie warunki i uzgodnienia z gestorami sieci zostały dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gdyż brak tego potwierdzenia uniemożliwia Wykonawcy wyliczenie kosztów wykonania tych czynności i prac.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

ZESTAW 2

Pytanie 1:

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia swoim zakresem nie wychodzi poza przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową – na rysunkach sytuacyjnych w projektach branżowych znajdują się takie elementy jak „projektowany wodociąg DN100 (wg odrębnego opracowania), projektowana kanalizacja DN200 (wg odrębnego opracowania), projektowany kabel oświetleniowy (wg odrębnego opracowania) – prosimy o potwierdzenie, że roboty związane z tą infrastrukturą nie stanowią przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Projektowany wodociąg DN100 oraz projektowana kanalizacja DN 200 nie stanowią przedmiotu zamówienia, natomiast projektowany kabel oświetleniowy należy uwzględnić w wycenie.

Pytanie 2:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje w ramach zamówienia przebudowy linii kablowej 110 kV, a jedynie zgodne z projektem wykonawczym zabezpieczenie robót branży sanitarnej wykonywanych w sąsiedztwie linii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje w ramach zamówienia przebudowy linii kablowej 110kV a jedynie zgodne z projektem wykonawczym zabezpieczenie robót branży sanitarnej wykonywanych w sąsiedztwie linii.





Pytanie 3:

§ 11 ust. 1 lit. a) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za zwłokę w stosunku do terminu zakończenia przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od terminu wykonania zamówienia określonego w § 2 ust. 1 umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 4:

§ 11 ust. 1 lit. b) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego oraz w okresie rękojmi lub gwarancji za wady w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 5:

§ 11 ust. 1 lit. f) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za zwłokę w rozpoczęciu robót w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 6:

§ 11 ust. 1 lit. h) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za zwłokę w przedłożeniu dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 7:

§ 11 ust. 1 lit. i) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę brzmienia treści na: „za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia”.

Pytanie 8:

§ 11 ust. 1 lit. n) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za zwłokę w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robót budowlanych,





o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn) lub nie uwzględnienie zastrzeżeń do niego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę brzmienia treści na: „za opóźnienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robót budowlanych, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn) lub nie uwzględnienie zastrzeżeń do niego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia”.

Pytanie 9:

§ 11 ust. 1 lit. u) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za zwłokę w przekazaniu kosztorysów szczegółowych/odkrycia cenowego, o którym mowa w § 1 ust. 9, w tym również za zwłokę w przekazaniu kosztorysów szczegółowych/odkrycia cenowego uwzględniających zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego – 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę brzmienia treści na: „za opóźnienie w przekazaniu kosztorysów szczegółowych/odkrycia cenowego, o którym mowa w § 1 ust. 9, w tym również za opóźnienie w przekazaniu kosztorysów szczegółowych/odkrycia cenowego uwzględniających zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego – 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia”.

Pytanie 10:

§ 11 ust. 1 lit. v) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za nieuzasadnioną odmowę przejęcia terenu budowy o którym mowa w § 5 ust. 1 – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 11:

§ 11 ust. 1 lit. x) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10 ust. 6 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 12:

Uprzejmie prosimy o zmianę terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, wyznaczonego obecnie na 20.08.2020 r., poprzez przedłużenie go co najmniej o kolejne 7 dni (tj. do dnia 27.08.2020 r.). Prośba o dodatkowy czas na złożenie ofert jest uzasadniona ze względu na okres wakacyjny, który wpłynął negatywnie na sytuację kadrową zarówno u wykonawców jak i potencjalnych podwykonawców, usługodawców i dostawców. Zwracamy uwagę, że zamówienie ma charakter wielobranżowy i ryczałtowy, zatem kluczowe jest precyzyjne wyliczenie kosztów dające wykonawcom możliwość ograniczenia rezerw finansowych przewidywanych na pokrycie ewentualnych ryzyk, związanych z realizacją zamówienia, co w sposób znaczący może przełożyć się na korzystniejsze dla Zamawiającego ceny ofertowe. Należy podkreślić, iż celem Wykonawcy jest wykonanie wyceny na tyle kompletnej, dokładnej i realnej, aby na etapie realizacji nie pojawiły się żadne





trudności, ani przeszkody. Z powyższego względu wydłużenie czasu na złożenie ofert byłoby korzystne zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego, dając gwarancję wykonania przedmiotu umowy w sposób terminowy i zgodny z oczekiwaniami obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę.

ZESTAW 3

Pytanie 1:

§ 1 ust. 3 lit. q) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o usunięcie punktu w związku z faktem, iż zamówienie prowadzone jest w formule „buduj”, zatem wykonywanie prac projektowych związanych z wprowadzeniem zamiennych rozwiązań projektowych na wniosek Wykonawcy lub nadzoru inwestorskiego należy do projektanta w ramach pełnionego nadzoru autorskiego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 2:

§ 6 ust. 1 Aktu Umowy – W związku z dopuszczeniem możliwości spełnienia obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę poprzez skorzystanie przez Wykonawcę z usług Podwykonawcy, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie okresu obowiązywania obowiązku poprzez jego ograniczenie do okresu, w którym realizowane będą roboty budowlane branży drogowej. Prosimy o modyfikację treści na następującą: „Wykonawca zobowiązuje się w okresie realizacji umowy w zakresie wykonania robót budowlanych branży drogowej do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) osób wykonujących prace w branży drogowej.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 3:

W związku z procedurami opisanymi w § 7 ust. 4 i 5 Aktu Umowy, Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zapisy ust. 3 odnoszą się do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapisy ust. 3 odnoszą się do wszystkich umów o podwykonawstwo.

Pytanie 4:


§ 7 ust. 4, pkt 5) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o skrócenie terminu, w którym Zamawiający może zgłosić sprzeciw w stosunku do umowy do 7 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 5:

§ 7 ust. 4, pkt 7) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o dopisanie na końcu zdania wyrażenia „jeśli uwagi te są zasadne i dotyczą naruszenia warunków kontraktu”.





Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 6:

§ 8 ust. 17 Aktu Umowy – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w związku z faktem, iż zamówienie prowadzone jest w formule „buduj”, koszty związane z wykonaniem projektów odnoszą się jedynie do kosztów wykonania projektów tymczasowej organizacji ruchu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż po stronie Wykonawcy leżą wszelkie prace oraz związane z tym koszty, niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

Pytanie 7:

§ 8 ust. 18 Aktu Umowy – Dodatkowe roboty budowlane to roboty nieprzewidywalne. Nieprzewidywalność wystąpienia dodatkowych robót musi mieć charakter obiektywny i wynikać z przyczyn zewnętrznych, co oznacza, że dodatkowych robót nie mógł przewidzieć zarówno zamawiający, jak i wykonawca. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, dodatkowe roboty budowlane nie mogą być objęte zamówieniem podstawowym. Wykonawca składając ofertę, zakłada że Zamawiający dołożył należytej staranności na etapie przygotowania postępowania, a zatem opis przedmiotu zamówienia (w szczególności projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz STWiORB) zawiera pełen zakres robót niezbędnych do wykonania w celu prawidłowej realizacji zamówienia i stanowi podstawę do sporządzenia porównywalnych ofert. Zgodnie z przepisami ustawy Pzp, pojawienie się konieczności wykonania robót dodatkowych, stanowi podstawę do zmiany umowy. W związku z powyższym wnosimy o zmianę sformułowania „wszystkie roboty dodatkowe” na „roboty niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 8:

§ 15 ust. 2 Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu. Zgodnie z Art. 29 ust. 1 Ustawy Pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Danie Zamawiającemu swobody nieograniczonego wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do STWiORB lub dokumentacji projektowej, przy jednoczesnym pozbawieniu Wykonawcy możliwości zwiększenia wynagrodzenia z tego tytułu uniemożliwia oszacowanie ryzyka, a w konsekwencji prawidłowe sporządzenie oferty. W związku z powyższym przytoczony zapis jest niezgodny z Ustawą Pzp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 9:

§ 11 ust. 1, lit. c) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary do wysokości 2,5% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.





Pytanie 10:

§ 11 ust. 1, lit. r) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary do wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 11:

§ 11 ust. 3 Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o dopisanie lit. b) o następującej treści: „z tytułu dokonania odbioru robót w terminie dłuższym niż 21 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru w wysokości 0,5%”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

ZESTAW 4

Pytanie 1:

W związku z faktem, iż przekazana przez Zamawiającego dokumentacja geotechniczna ogranicza się do odwiertów wykonanych na działkach przyległych, Wykonawca zwraca się z prośbą o zezwolenie na wejście na teren planowanej inwestycji w celu wykonania odwiertu geotechnicznego, który potwierdzi warunki gruntowo-wodne opisane w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wejście na teren planowanej inwestycji w celu wykonania odwiertu geotechnicznego.

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp – Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie:

1. W Tomie I SIWZ **pkt 13.2** otrzymuje brzmienie:

...”13.2 Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu. Opakowanie należy opisać następująco:

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175

Oferta w postępowaniu pn:

„Budowa drogi 2KDY na terenie Nowego Centrum Łodzi”

Nr sprawy ZIM-DZ.2620.32.2020

Nie otwierać przed dniem 02.09.2020 r., godz. 14:00

2. W Tomie I SIWZ **pkt 14.1** otrzymuje brzmienie:





...”14.1 Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych (Kancelaria ZIM), ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź w nieprzekraczalnym terminie do dnia **02.09.2020 r., godz. 13:00.”...**

3. W Tomie I SIWZ pkt 19.1 otrzymuje brzmienie:

...”19.1 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Zarządzie Inwestycji Miejskich, w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, sala Centrum Sterowania Ruchem, w dniu **02.09.2020 r., o godz. 14:00.”...**

4. W Tomie IV pkt 14.1 otrzymuje brzmienie:

...”14.1. Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **02.09.2020 r., godz. 13:00.”...**

5. W Tomie IV pkt 19.1.1 otrzymuje brzmienie:

...”19.1.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Zarządzie Inwestycji Miejskich, w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, sala CSR, w dniu **02.09.2020 r., o godzinie 14:00.”...**

III. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp – Zamawiający dokonuje zmiany treści TOMu II SIWZ w poniższym zakresie:

1. § 11 ust. 1 lit. i) otrzymuje brzmienie:

„...za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **0,05%** wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia”

2. § 11 ust.1 lit. n) otrzymuje brzmienie:

„...za opóźnienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robót budowlanych, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn) lub nie uwzględnienie zastrzeżeń do niego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **0,05%** wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia”

3. § 11 ust.1 lit. u) otrzymuje brzmienie:

„...za opóźnienie w przekazaniu kosztorysów szczegółowych/odkrycia cenowego, o którym mowa w § 1 ust. 9, w tym również za opóźnienie w przekazaniu kosztorysów szczegółowych/odkrycia cenowego uwzględniających zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego - **0,05%** wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia”

Zamawiający zmienia TOM II SIWZ Formularz Aktu Umowy, zgodnie z załączonym plikiem - załącznik numer 1 do zmiany SIWZ.





IV. Zamawiający wprowadza zmianę w ogłoszeniu o zamówieniu, w zakresie:

1. **SEKCJI IV, pkt IV.6.2)**, który otrzymuje brzmienie:

...”Data: **2020-09-02, godzina: 13:00,**

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Język polski”...

Zmiany, o których mowa powyżej, prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Powyższe zmiany treści SIWZ wraz ze zmianą Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem:

<https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10520,Budowa-drogi-2KDY-na-terenie-Nowego-Centrum-Lodzi.html>

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia powyższych udzielonych wyjaśnień oraz wprowadzonych zmian.

**Z-CA DYREKTORA
ds. Rewitalizacji Obszarowej
i Inwestycji Kubaturowych
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH**

Andrzej Mikołajewski

Załącznik:

Załącznik nr 1 - Zmieniony Tom II SIWZ - Formularz Aktu Umowy

Sprawę prowadzi:
Magdalena Filipczak
Wydział Zamówień Publicznych
tel. 42/ 272-64-62



Łódź, dnia 28.08.2020 r.

ZIM-DZ.2620.32.2020

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Budowa drogi 2KDY na terenie Nowego Centrum Łodzi**” Nr sprawy **ZIM-DZ.2620.32.2020**

- I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp – do Zamawiającego zostały wniesione pytania¹ Wykonawców, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

ZESTAW 1

Pytanie 1:

Prosimy o uzupełnienie dokumentów formalnych o Decyzję Pozwolenia na budowę i Zgłoszenia. Powyższe dokumenty nie zostały dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż niezbędne dokumenty zezwalające na rozpoczęcie robót zostaną przekazane po podpisaniu umowy i zatwierdzeniu projektu TOR. Zamawiający jest aktualnie w trakcie uzyskiwania w/w dokumentów.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie że Dokumentacja Projektowa jest kompletna dla realizacji zadania budowy drogi 2KDY.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ze względu na postępujące zmiany dotyczące sąsiedniej inwestycji, tj. 7KDY, Zamawiający przekaże autorowi opracowania dokumentacji projektowej ostateczne wytyczne do zaktualizowania projektu okablowania dla monitoringu. Zmiany dotyczyć mogą wyboru rozwiązania umiejscowienia skrzynek dla monitoringu.

Pytanie 3:

Prosimy o przekazanie odwiertów geologicznych na obszarze prowadzenia prac – prosimy o wskazaniem układu warstw podłoża gruntowego dla terenu prowadzonych prac - nie zostały dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż opracowanie geologiczne zawierające układ warstw podłoża gruntowego znajduje się w dokumentacji projektowej „CZĘŚĆ I – ZESZYT 2 – V OPRACOWANIE GEOLOGICZNE”.

Pytanie 4:

Z uwagi na połączenie oświetlenia 2KDY z oświetleniem inne inwestycji, tj. 7KDY prosimy o przedstawienie pełnego schematu sieci, niezbędnych obliczeń i doboru zabezpieczeń – nie zostały dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż miejscem zasilania instalacji oświetlenia jest słup oświetlenia podstawowego na terenie drogi 7KDY. Szczegóły dot. zasilania zostały przedstawione na rysunku pt. „schemat jednokreskowy”. Oświetlenie zostało zaprojektowane kablem YAKY 5x16, podział opraw na 3 fazy. Obliczenia zostały zawarte w dokumentacji projektowej.


Pytanie 5:

Prosimy o przekazanie detalu połączenia z 3KDY i 7KDY- nie zostały dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wszelkie uszczegółowienia zostaną przekazane po podpisaniu umowy.

Wycinek rysunku z uszczegółowieniem styku nawierzchni:

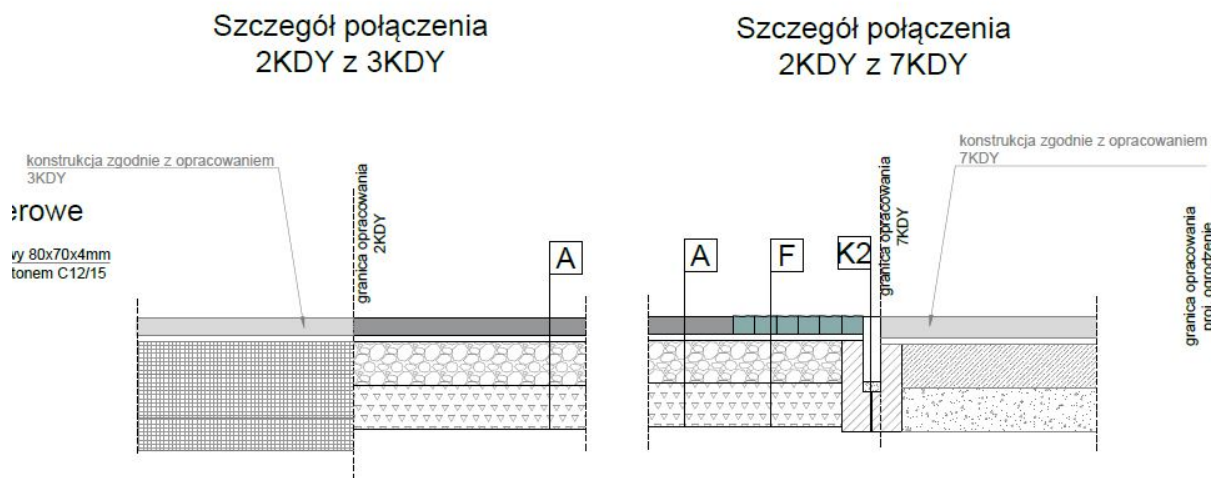

Pytanie 6:

Prosimy o przekazanie dokumentów wskazanych w opracowaniu „wg odrębnego opracowania” np. na rys BZB54-PW-KDS-RYS-00001-3.pdf.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż opracowanie jest kompletne. Po podpisaniu umowy zostanie przekazane opracowanie bez powyższego zapisu.

Pytanie 7:

Prosimy o jednoznaczne określenie materiału wykończeniowego na pochylni środkowej ? (opis techniczny określa wykonanie płytami granitowymi 40x60, a rysunki 25x25).





Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rysunki określają nawierzchnię na pochylni środkowej (pochylnia nr 3 – rys. BZB54-PW-PZT-RYS00108-3) jako typ nawierzchni nr 2 – płyty granitowe 40x60.

Pytanie 8:

Prosimy o jednoznaczne określenie materiału wykończeniowego na pochylni południowej (opis techniczny w PB określa wykonanie klinkierem, natomiast rysunek pokazuje wykonanie z płyt granitowych).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pochylnia nr 1 (południowa) zgodnie z rysunkami PZT wykończona jest nawierzchnią nr 3 – płyty granitowe 25x25. Pochylnia nr 2 (północna) jest wykończona w klinkierze.

Pytanie 9:

Odwodnienie zostało narysowane jako niebieska gruba kreska (tak samo jak szyna stalowa zatopiona) oraz czerwone kreskowane linie. Prosimy o wyjaśnienie położenia i ujednoczenie oznakowania na dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż szyny wrysowane są innym kolorem niż odwodnienie. Na rysunkach z branży instalacyjnej szyny są zatem wyszarzone.

Pytanie 10:

Prosimy o wskazanie jakości materiałów na detalach rysunków tak aby Wykonawca wiedział jakich parametrów oczekuje Zamawiający, z uwagi na to, że nie zostały one określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż jakość materiałów określona została w opracowaniu STWIORB.

Pytanie 11:

Prosimy o jednoznaczne wskazanie miąższości warstwy podsypki pod kostką klinkierową (opis zawiera warstwę 4 cm rysunki zaś 5 cm).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż miąższość warstwy podsypki pod kostką klinkierową wynosi 4 cm.

Pytanie 12:

Prosimy o jednoznaczne określenie wymiarów kostki klinkierowej, w większości dokumentacji miąższość warstwy kostki to 7 cm, a w przekroju pochylni ma ona 6cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wysokość kostki klinkierowej wynosi 7 cm.

Pytanie 13:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o poprawny schemat położenia warstw wykończeniowych oraz wrysowanie kopertowań oraz rzędnych na połączeniu z istniejącymi nawierzchniami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wszelkie uszczegółowienia zostaną przekazane po podpisaniu umowy.





Pytanie 14:

Z uwagi na budowę systemu CCTV w ciągu 2KDY zawierającego kolejne pk. kamerowe prosimy o informację, o jakie elementy należy rozbudować system miejski.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy zapewnić 2 szt. Przestrzeni dyskowej RAID 6 o pojemności rzędu 6000 GB

Pytanie 15:

Prosimy o określenie sposobu „zamknięcia” nawierzchni w miejscach projektowanych budynków na działce sąsiedniej nr 180/68.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż sposób „zamknięcia” nawierzchni w miejscach projektowanych budynków został pokazany w opracowaniu drogowym dokumentacji.

Pytanie 16:

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający zapewni ze strony Projektanta nadzór autorski (zgodnie z Ustawą PB) w trakcie realizacji prac.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapewni ze strony Projektanta nadzór autorski w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

Pytanie 17:

Prosimy o modyfikację postanowień §8 ust 17 poprzez wykreślenie obowiązku ujęcia w wynagrodzeniu kosztu prac projektowych z uwagi na fakt, że Przedmiot Zamówienia nie obejmuje wykonania prac projektowych przez Wykonawcę i z tego względu postanowienie te są sprzeczne z zakresem Przedmiotu Zamówienia. Ewentualnie wnosimy o jednoznaczne określenie przez Zamawiającego jakie prace projektowe miałyby wykonywać Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia i przesłanie szczegółowe zakresu tych prac umożliwiającego wykonanie wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. Równocześnie Zamawiający informuje, iż wszystkie obowiązki Wykonawcy zostały wyszczególnione w SIWZ.

Pytanie 18:

Wnosimy o usunięcie postanowień §1 ust 3 lit. q, z uwagi na fakt, że Wykonawca nie ma możliwości wykonania wyceny tego zakresu prac, ponieważ dokumentacja projektowa została wykonana na zlecenie Zamawiającego i wprowadzanie ewentualnych zmian odbywać się będzie na podstawie uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a autorem dokumentacji projektowej, na które Wykonawca nie ma wpływu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 19:

Prosimy o potwierdzenie, że profil ułożenia linii 110kV jest zgodny z zamieszczonym w dokumentacji przetargowej.





Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że profil ułożenia linii 110kV, który został zamieszczony w dokumentacji przetargowej może różnić się w stosunku do stanu istniejącego w związku z prowadzonymi pracami na styku budowy drogi 2KDY z drogą 7KDY (usunięcie kolizji linii kablowej z projektowaną drogą podziemną).

Pytanie 20:

Prosimy o potwierdzenie, że profil kanalizacji teletechnicznej i zastosowane rozwiązania są zgodne z wymaganiami Zamawiającego i ZDiT.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zastosowane rozwiązania są zgodne z wymaganiami Zamawiającego i ZDiT.

Pytanie 21:

Z uwagi na sąsiedztwo RPZ Śródmieście prosimy o informację, czy uzgodniono z Gestorem Sieci (podczas prowadzenia prac) możliwość dojazdu służb PGE do swoich urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie prowadził żadnych uzgodnień z Gestorem Sieci.

Pytanie 22:

Prosimy po potwierdzenie, że projektowane nasadzenia mają być zgodne z przedstawionymi dokumentami i zbliżeniami z infrastrukturą podziemną.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż projektowane nasadzenia uzgodnione zostały z Biurem Architekta Miasta. W opisie technicznym w projekcie zieleni znajduje się informacja na temat rozwiązań w przypadku z potencjalnymi kolizjami z infrastrukturą podziemną.

Pytanie 23:

Prosimy o informację, czy dokumentacja przetargowa uwzględnia w swoim zakresie możliwość ułożenia zasilania sąsiedniej inwestycji, tj. drogi podziemnej w ciągu 7KDY.

Odpowiedź:

Dokumentacja przetargowa nie uwzględnia w swoim zakresie ułożenia zasilania sąsiedniej inwestycji, tj. drogi podziemnej w ciągu 7KDY.

Pytanie 24:

W dokumentacji branży sanitarnej widnieją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla potrzeb dz. 180/68. Prosimy o informację, kiedy przewidywana jest realizacja tego zakresu? Powyższe jest niezbędne do prawidłowego wykonania prac w ramach Przedmiotu Zamówienia dot. instalacji sanitarnych na terenie 2KDY.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada informacji, kiedy przewidywana jest realizacja robót na działce 180/68.

Pytanie 25:

Prosimy o informację, czy sieci sanitarne będą wykonywane zgodnie z Decyzją Pozwolenia na budowę lub Zgłoszenia. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie wskazanych dokumentów, gdyż nie zostały one dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.





Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1.

Pytanie 26:

Prosimy o informację, czy sieci wod-kan w ciągu ul. 3KDY zostały przejęte przez ZWiK.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada wiedzy na temat drogi 3KDY.

Pytanie 27:

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada wytyczne PGE i PKP Energetyka dot. pracy w zbliżeniu linii 110kV i w przypadku gdy takie wytyczne Zamawiający uzyskał prosimy o ich przekazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż warunki prac w zbliżeniu znajdują się w części dokumentacji z załącznikami formalnymi.

Pytanie 28:

Z uwagi na silnie zurbanizowany teren wokół przewidywanego placu budowy, inne toczące się inwestycje, prosimy o wskazanie możliwych punktów poboru mediów na potrzeby zaplecza budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż powyższe pozostaje w gestii Wykonawcy.

Pytanie 29:

Prosimy o wskazanie terenu przewidzianego na potrzeby zaplecza budowy, placów składowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż powyższe pozostaje w gestii Wykonawcy.

Pytanie 30:

Prosimy o precyzyjne podanie jaki zakres prac przedmiotu zamówienia stanowi przebudowa drogi 2KDY.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres prac przedstawiony został w dokumentacji projektowej.

Pytanie 31:

Prosimy o wskazanie czy Wykonawca winien w swojej ofercie zawrzeć koszty ewentualnych wyłączeń i nadzorów ze strony PGE i PKP Energetyka.

Odpowiedź:

Wykonawca winien w swojej ofercie zawrzeć koszty ewentualnych wyłączeń i nadzorów ze strony PGE i PKP Energetyka.

Pytanie 32:

Z uwagi na połączenie urządzeń monitoringu CCTV 2KDY z sąsiednią inwestycją 7KDY prosimy o informację, czy w ofercie należy ująć koszty związane z wejściem na tą budowę i na jakich dokładanie zasadach się to odbędzie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż po stronie Wykonawcy jest koordynacja z sąsiednimi inwestycjami i ewentualne roboty oraz koszty z tym związane.





Pytanie 33:

Prosimy o potwierdzenie, iż w ofercie należy ująć koszty związane w szczególności z postanowieniami § 1, pk. 3 ustęp d) umowy, tj. wykonaniem inwentaryzacji budynków i dróg sąsiadujących z placem budowy przed rozpoczęciem robót.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w ofercie należy ująć wszystkie w/w koszty.

Pytanie 34:

Prosimy o określenie długości gwarancji na zabudowywane materiały/urządzenia elektryczne i teletechniczne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż gwarancja na zabudowywane materiały/urządzenia elektryczne wynosi 5 lat, natomiast na słupy 10 lat.

Pytanie 35:

Prosimy o informację, kto będzie ponosił koszty wejścia w tereny osób trzecich niezbędnych do realizacji inwestycji i czy Zamawiający jest w posiadaniu takich zgód.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ewentualna konieczność wejścia w teren przyległy do inwestycji w celu prawidłowej realizacji zadania, oraz związane z tym koszty, pozostaje po stronie Wykonawcy.

Pytanie 36:

W związku z postanowieniami § 1 ust. 3 lit. hh, prosimy o szczegółowe wskazanie, jakie podmioty planują wykonywanie prac na terenie budowy oraz w jakich terminach. Obecne brzmienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest niejasne w tym zakresie i nie pozwala na przewidzenie sposobu realizacji Przedmiotu Zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada takiej wiedzy.

Pytanie 37:

Prosimy o informacje czy realizowane prace objęte Przedmiotem Zamówienia będą ingerowały w zakresy wykonane przez inne podmioty i objęte gwarancją tych wykonawców. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, prosimy o informacje czy w przypadku ingerencji w zakresy wykonane przez innych wykonawców zasady gwarancji tych wykonawców została z nimi uzgodnione i jeżeli tak prosimy o przestanie uzgodnienia lub wyjaśnienie na jakich zasadach te ingerencje będą się odbywały.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ewentualna konieczność ingerencji w zakresy wykonanych sąsiednich inwestycji, tj. wszelkie uzgodnienia związane z gwarancją i technologią prowadzonych prac, leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie 38:

Z uwagi na prowadzone prace w ciągu 7KDY prosimy o podanie planowanego zakończenia prac budowy 7KDY.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż planowany termin zakończenia budowy drogi 7KDY to 30.08.2021.





Pytanie 39:

Prosimy o informację czy Zamawiający planuje realizować w trakcie trwania umowy na jej terenie inne prace bądź udostępnić teren osobą trzecim. Prosimy o podanie zakresu i terminu planowanych realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie ma wiedzy na temat planowanych inwestycji na sąsiednich działkach.

Pytanie 40:

Prosimy o wykreślenie z postanowień § 1 ust. 3 lit. jj umowy obowiązku weryfikowania z gestorami sieci przebiegu sieci przez teren budowy. Taka weryfikacja dokonywana jest na etapie sporządzania dokumentacji projektowej i za jej prawidłowość odpowiada projektant. Prosimy zatem o potwierdzenie, że taka weryfikacja została przeprowadzona. Ponadto w związku z nałożeniem na Wykonawcę, w tym samym postanowieniu, obowiązku realizacji wszystkich obowiązków wynikających z uzgodnień i warunków gestorów sieci, prosimy o potwierdzenie, że wszystkie warunki i uzgodnienia z gestorami sieci zostały dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gdyż brak tego potwierdzenia uniemożliwia Wykonawcy wyliczenie kosztów wykonania tych czynności i prac.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

ZESTAW 2

Pytanie 1:

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia swoim zakresem nie wychodzi poza przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową – na rysunkach sytuacyjnych w projektach branżowych znajdują się takie elementy jak „projektowany wodociąg DN100 (wg odrębnego opracowania), projektowana kanalizacja DN200 (wg odrębnego opracowania), projektowany kabel oświetleniowy (wg odrębnego opracowania) – prosimy o potwierdzenie, że roboty związane z tą infrastrukturą nie stanowią przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Projektowany wodociąg DN100 oraz projektowana kanalizacja DN 200 nie stanowią przedmiotu zamówienia, natomiast projektowany kabel oświetleniowy należy uwzględnić w wycenie.

Pytanie 2:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje w ramach zamówienia przebudowy linii kablowej 110 kV, a jedynie zgodne z projektem wykonawczym zabezpieczenie robót branży sanitarnej wykonywanych w sąsiedztwie linii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje w ramach zamówienia przebudowy linii kablowej 110kV a jedynie zgodne z projektem wykonawczym zabezpieczenie robót branży sanitarnej wykonywanych w sąsiedztwie linii.





Pytanie 3:

§ 11 ust. 1 lit. a) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za zwłokę w stosunku do terminu zakończenia przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od terminu wykonania zamówienia określonego w § 2 ust. 1 umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 4:

§ 11 ust. 1 lit. b) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego oraz w okresie rękojmi lub gwarancji za wady w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 5:

§ 11 ust. 1 lit. f) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za zwłokę w rozpoczęciu robót w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 6:

§ 11 ust. 1 lit. h) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za zwłokę w przedłożeniu dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 7:

§ 11 ust. 1 lit. i) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę brzmienia treści na: „za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia”.

Pytanie 8:

§ 11 ust. 1 lit. n) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za zwłokę w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robót budowlanych,





o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn) lub nie uwzględnienie zastrzeżeń do niego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę brzmienia treści na: „za opóźnienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robót budowlanych, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn) lub nie uwzględnienie zastrzeżeń do niego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia”.

Pytanie 9:

§ 11 ust. 1 lit. u) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za zwłokę w przekazaniu kosztorysów szczegółowych/odkrycia cenowego, o którym mowa w § 1 ust. 9, w tym również za zwłokę w przekazaniu kosztorysów szczegółowych/odkrycia cenowego uwzględniających zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego – 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę brzmienia treści na: „za opóźnienie w przekazaniu kosztorysów szczegółowych/odkrycia cenowego, o którym mowa w § 1 ust. 9, w tym również za opóźnienie w przekazaniu kosztorysów szczegółowych/odkrycia cenowego uwzględniających zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego – 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia”.

Pytanie 10:

§ 11 ust. 1 lit. v) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za nieuzasadnioną odmowę przejęcia terenu budowy o którym mowa w § 5 ust. 1 – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 11:

§ 11 ust. 1 lit. x) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10 ust. 6 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 12:

Uprzejmie prosimy o zmianę terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, wyznaczonego obecnie na 20.08.2020 r., poprzez przedłużenie go co najmniej o kolejne 7 dni (tj. do dnia 27.08.2020 r.). Prośba o dodatkowy czas na złożenie ofert jest uzasadniona ze względu na okres wakacyjny, który wpłynął negatywnie na sytuację kadrową zarówno u wykonawców jak i potencjalnych podwykonawców, usługodawców i dostawców. Zwracamy uwagę, że zamówienie ma charakter wielobranżowy i ryczałtowy, zatem kluczowe jest precyzyjne wyliczenie kosztów dające wykonawcom możliwość ograniczenia rezerw finansowych przewidywanych na pokrycie ewentualnych ryzyk, związanych z realizacją zamówienia, co w sposób znaczący może przełożyć się na korzystniejsze dla Zamawiającego ceny ofertowe. Należy podkreślić, iż celem Wykonawcy jest wykonanie wyceny na tyle kompletnej, dokładnej i realnej, aby na etapie realizacji nie pojawiły się żadne





trudności, ani przeszkody. Z powyższego względu wydłużenie czasu na złożenie ofert byłoby korzystne zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego, dając gwarancję wykonania przedmiotu umowy w sposób terminowy i zgodny z oczekiwaniami obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę.

ZESTAW 3

Pytanie 1:

§ 1 ust. 3 lit. q) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o usunięcie punktu w związku z faktem, iż zamówienie prowadzone jest w formule „buduj”, zatem wykonywanie prac projektowych związanych z wprowadzeniem zamiennych rozwiązań projektowych na wniosek Wykonawcy lub nadzoru inwestorskiego należy do projektanta w ramach pełnionego nadzoru autorskiego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 2:

§ 6 ust. 1 Aktu Umowy – W związku z dopuszczeniem możliwości spełnienia obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę poprzez skorzystanie przez Wykonawcę z usług Podwykonawcy, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie okresu obowiązywania obowiązku poprzez jego ograniczenie do okresu, w którym realizowane będą roboty budowlane branży drogowej. Prosimy o modyfikację treści na następującą: „Wykonawca zobowiązuje się w okresie realizacji umowy w zakresie wykonania robót budowlanych branży drogowej do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) osób wykonujących prace w branży drogowej.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 3:

W związku z procedurami opisanymi w § 7 ust. 4 i 5 Aktu Umowy, Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zapisy ust. 3 odnoszą się do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapisy ust. 3 odnoszą się do wszystkich umów o podwykonawstwo.

Pytanie 4:


§ 7 ust. 4, pkt 5) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o skrócenie terminu, w którym Zamawiający może zgłosić sprzeciw w stosunku do umowy do 7 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 5:

§ 7 ust. 4, pkt 7) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o dopisanie na końcu zdania wyrażenia „jeśli uwagi te są zasadne i dotyczą naruszenia warunków kontraktu”.





Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 6:

§ 8 ust. 17 Aktu Umowy – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w związku z faktem, iż zamówienie prowadzone jest w formule „buduj”, koszty związane z wykonaniem projektów odnoszą się jedynie do kosztów wykonania projektów tymczasowej organizacji ruchu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż po stronie Wykonawcy leżą wszelkie prace oraz związane z tym koszty, niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

Pytanie 7:

§ 8 ust. 18 Aktu Umowy – Dodatkowe roboty budowlane to roboty nieprzewidywalne. Nieprzewidywalność wystąpienia dodatkowych robót musi mieć charakter obiektywny i wynikać z przyczyn zewnętrznych, co oznacza, że dodatkowych robót nie mógł przewidzieć zarówno zamawiający, jak i wykonawca. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, dodatkowe roboty budowlane nie mogą być objęte zamówieniem podstawowym. Wykonawca składając ofertę, zakłada że Zamawiający dołożył należytej staranności na etapie przygotowania postępowania, a zatem opis przedmiotu zamówienia (w szczególności projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz STWiORB) zawiera pełen zakres robót niezbędnych do wykonania w celu prawidłowej realizacji zamówienia i stanowi podstawę do sporządzenia porównywalnych ofert. Zgodnie z przepisami ustawy Pzp, pojawienie się konieczności wykonania robót dodatkowych, stanowi podstawę do zmiany umowy. W związku z powyższym wnosimy o zmianę sformułowania „wszystkie roboty dodatkowe” na „roboty niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 8:

§ 15 ust. 2 Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu. Zgodnie z Art. 29 ust. 1 Ustawy Pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Danie Zamawiającemu swobody nieograniczonego wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do STWiORB lub dokumentacji projektowej, przy jednoczesnym pozbawieniu Wykonawcy możliwości zwiększenia wynagrodzenia z tego tytułu uniemożliwia oszacowanie ryzyka, a w konsekwencji prawidłowe sporządzenie oferty. W związku z powyższym przytoczony zapis jest niezgodny z Ustawą Pzp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 9:

§ 11 ust. 1, lit. c) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary do wysokości 2,5% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.





Pytanie 10:

§ 11 ust. 1, lit. r) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary do wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 11:

§ 11 ust. 3 Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o dopisanie lit. b) o następującej treści: „z tytułu dokonania odbioru robót w terminie dłuższym niż 21 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru w wysokości 0,5%”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę.

ZESTAW 4

Pytanie 1:

W związku z faktem, iż przekazana przez Zamawiającego dokumentacja geotechniczna ogranicza się do odwiertów wykonanych na działkach przyległych, Wykonawca zwraca się z prośbą o zezwolenie na wejście na teren planowanej inwestycji w celu wykonania odwiertu geotechnicznego, który potwierdzi warunki gruntowo-wodne opisane w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wejście na teren planowanej inwestycji w celu wykonania odwiertu geotechnicznego.

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp – Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie:

1. W Tomie I SIWZ **pkt 13.2** otrzymuje brzmienie:

...”13.2 Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu. Opakowanie należy opisać następująco:

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175

Oferta w postępowaniu pn:

„Budowa drogi 2KDY na terenie Nowego Centrum Łodzi”

Nr sprawy ZIM-DZ.2620.32.2020

Nie otwierać przed dniem 02.09.2020 r., godz. 14:00

2. W Tomie I SIWZ **pkt 14.1** otrzymuje brzmienie:





...”14.1 Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych (Kancelaria ZIM), ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź w nieprzekraczalnym terminie do dnia **02.09.2020 r., godz. 13:00.”...**

3. W Tomie I SIWZ pkt 19.1 otrzymuje brzmienie:

...”19.1 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Zarządzie Inwestycji Miejskich, w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, sala Centrum Sterowania Ruchem, w dniu **02.09.2020 r., o godz. 14:00.”...**

4. W Tomie IV pkt 14.1 otrzymuje brzmienie:

...”14.1. Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **02.09.2020 r., godz. 13:00.”...**

5. W Tomie IV pkt 19.1.1 otrzymuje brzmienie:

...”19.1.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Zarządzie Inwestycji Miejskich, w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, sala CSR, w dniu **02.09.2020 r., o godzinie 14:00.”...**

III. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp – Zamawiający dokonuje zmiany treści TOMu II SIWZ w poniższym zakresie:

1. § 11 ust. 1 lit. i) otrzymuje brzmienie:

„...za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **0,05%** wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia”

2. § 11 ust.1 lit. n) otrzymuje brzmienie:

„...za opóźnienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robót budowlanych, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn) lub nie uwzględnienie zastrzeżeń do niego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **0,05%** wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia”

3. § 11 ust.1 lit. u) otrzymuje brzmienie:

„...za opóźnienie w przekazaniu kosztorysów szczegółowych/odkrycia cenowego, o którym mowa w § 1 ust. 9, w tym również za opóźnienie w przekazaniu kosztorysów szczegółowych/odkrycia cenowego uwzględniających zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego - **0,05%** wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia”

Zamawiający zmienia TOM II SIWZ Formularz Aktu Umowy, zgodnie z załączonym plikiem - załącznik numer 1 do zmiany SIWZ.





IV. Zamawiający wprowadza zmianę w ogłoszeniu o zamówieniu, w zakresie:

1. **SEKCJI IV, pkt IV.6.2)**, który otrzymuje brzmienie:

...”Data: **2020-09-02, godzina: 13:00,**

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Język polski”...

Zmiany, o których mowa powyżej, prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Powyższe zmiany treści SIWZ wraz ze zmianą Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem:

<https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10520,Budowa-drogi-2KDY-na-terenie-Nowego-Centrum-Lodzi.html>

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia powyższych udzielonych wyjaśnień oraz wprowadzonych zmian.

**Z-CA DYREKTORA
ds. Rewitalizacji Obszarowej
i Inwestycji Kubaturowych
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH**

Andrzej Mikołajewski

Załącznik:

Załącznik nr 1 - Zmieniony Tom II SIWZ - Formularz Aktu Umowy

Sprawę prowadzi:
Magdalena Filipczak
Wydział Zamówień Publicznych
tel. 42/ 272-64-62

